
LE MONDE

Upgrade do Sistema de Controle de Acesso e sala de Monitoramento


Início do projeto: qua, 15/4/2020

Semana de exibição: 14

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	Dia I / T
Contratação					
Aprovação da proposta 9270/20	Le Monde	100%	15/04/20	15/04/20	Qua / Qua
Liberação de Início de Projeto	Le Monde	100%	15/04/20	27/04/20	Qua / Seg
Planejamento					
Planejamento nova Sala de monitoramento	High Link	100%	27/04/20	15/05/20	Seg / Sex
Aprovação Layout Sala de Monitoramento	Le Monde	100%	17/05/20	05/06/20	Dom / Sex
Planejamento novas Infraestruturas para o SCA	High Link	100%	27/04/20	24/05/20	Seg / Dom
Ajustes e Aprovação novas Infraestruturas para o SCA	Le Monde	100%	24/05/20	12/06/20	Dom / Sex
Execução - Sala de Monitoramento Nova					
Fabricação e instalação Novos Móveis	Le Monde	30%	15/06/20	14/08/20	Seg / Sex
Instalação piso cerâmico	Le Monde	30%	15/06/20	14/08/20	Seg / Sex
Instalação teto de placas removíveis	Le Monde	30%	15/06/20	14/08/20	Seg / Sex
Instalação Iluminação	Le Monde	30%	15/06/20	14/08/20	Seg / Sex
Instalação Ar Condicionado	Le Monde	30%	15/06/20	14/08/20	Seg / Sex
Lançamento de Cabos Sala de Monitoramento	High Link	0%	17/08/20	04/09/20	Seg / Sex
Instalação equipamentos Sala de Monitoramento	High Link	0%	07/09/20	19/09/20	Seg / Sáb
Ativação e configuração Sala de Monitoramento	High Link	0%	19/09/20	25/09/20	Sáb / Sex
Entrega Sala de monitoramento	High Link	0%	25/09/20	25/09/20	Sex / Sex
Execução - Sistema de Controle de Acesso					
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA Entre Blocos	Le Monde	100%	15/06/20	22/07/20	Seg / Qua
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Londres	Le Monde	20%	23/07/20	28/07/20	Qui / Ter
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Toronto 1000	Le Monde	5%	24/07/20	31/07/20	Sex / Sex
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Toronto 2000	Le Monde	5%	25/07/20	03/08/20	Sáb / Seg
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Toronto 3000	Le Monde	5%	26/07/20	06/08/20	Dom / Qui
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Hong Kong 1000	Le Monde	5%	27/07/20	09/08/20	Seg / Dom
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Hong Kong 2000	Le Monde	5%	28/07/20	12/08/20	Ter / Qua
Infraestrutura passagem dos Cabos SCA - Hong Kong 3000	Le Monde	5%	29/07/20	14/08/20	Qua / Sex
Lançamento de Cabos SCA	High Link	0%	27/07/20	19/09/20	Seg / Sáb
Instalação placa Tornique	Le Monde	0%	27/07/20	21/08/20	Seg / Sex
Instalação equipamentos SCA	High Link	0%	21/09/20	29/10/20	Seg / Qui
Configuração e Ativação SCA	High Link	0%	05/10/20	30/10/20	Seg / Sex

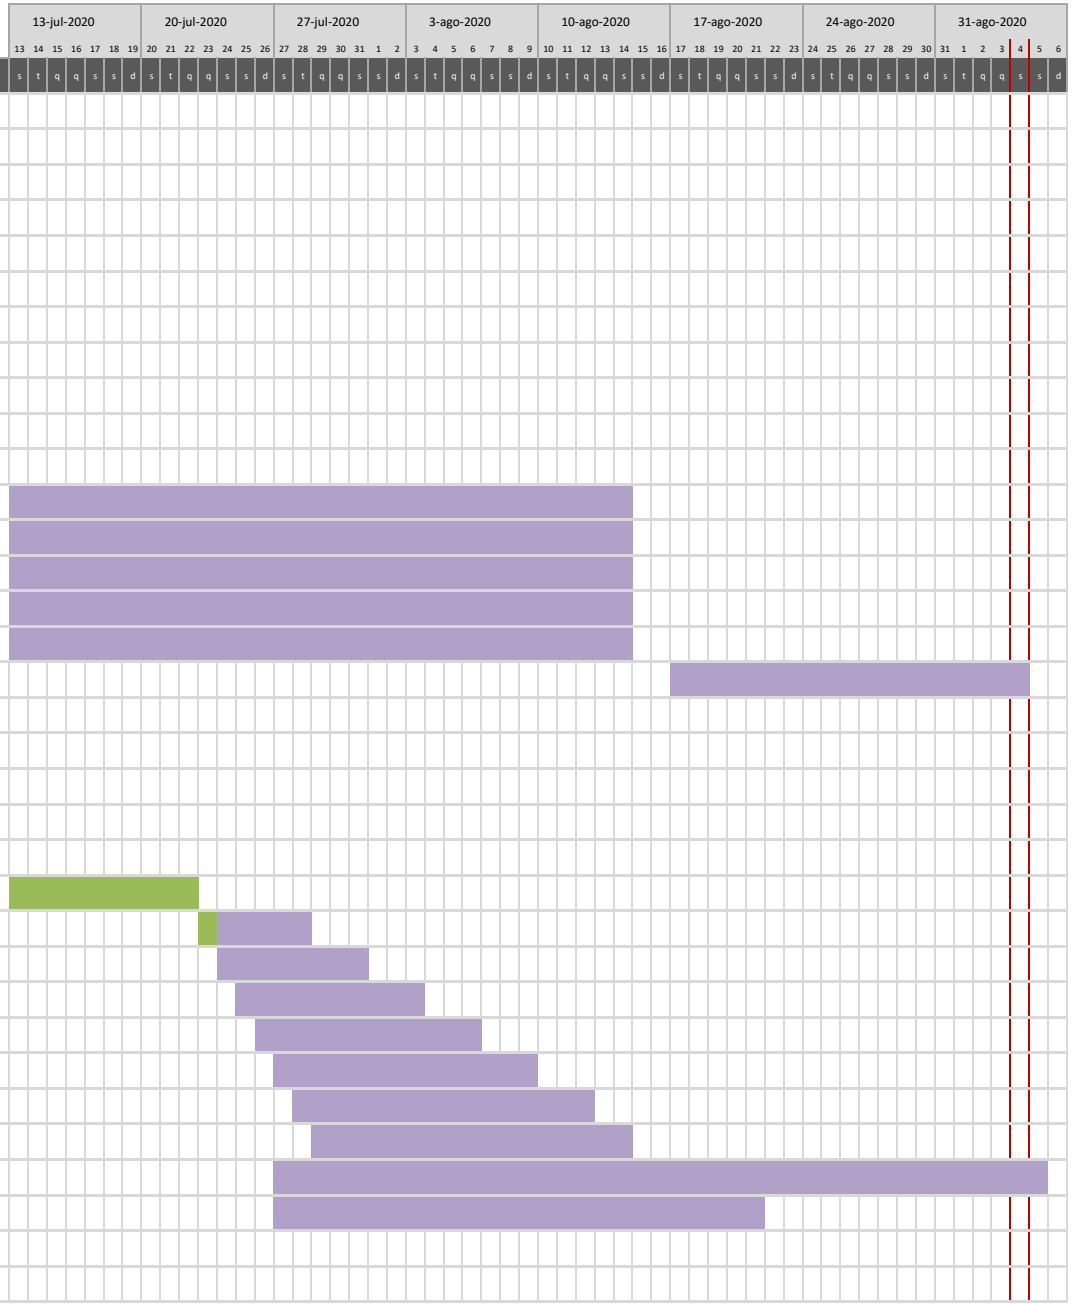

Semana de exibição: 14

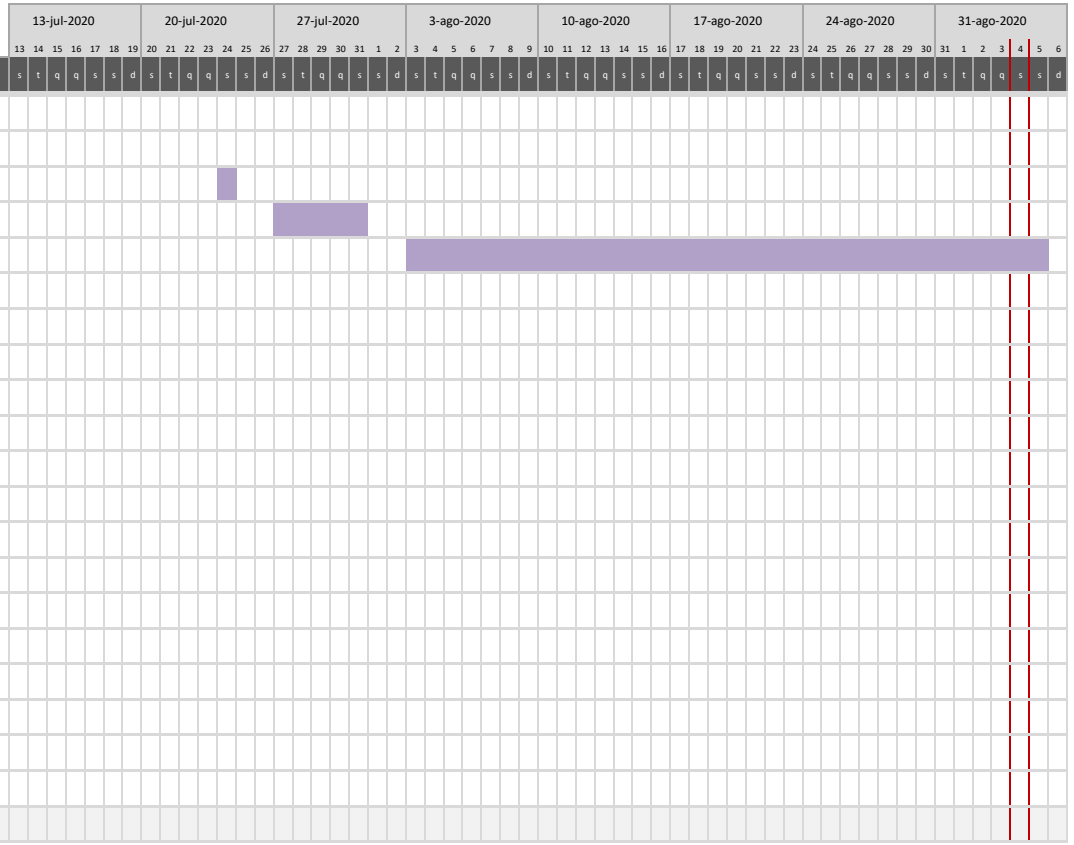

TAREFA	ATRIBUÍDO PARA	PROGRESSO	INÍCIO	TÉRMINO	Dia I / T
Cadastramento de usuários - Sistema de Controle de Acesso					
Enviar Planilha Excel com os Cadastros de pessoas e Unidades	Le Monde	0%	24/07/20	24/07/20	Sex / Sex
Cadastrar Usuário no Sistema SCA	High Link	0%	27/07/20	31/07/20	Seg / Sex
Cadastramento de usuários no Sistema SCA	Le Monde	0%	03/08/20	02/10/20	Seg / Sex
Startup - Sistema de Controle de Acesso					
Startup SCA - Londres	High Link	0%	09/10/20	10/10/20	Sex / Sáb
Startup SCA - Toronto 1000	High Link	0%	12/10/20	13/10/20	Seg / Ter
Startup SCA - Toronto 2000	High Link	0%	14/10/20	15/10/20	Qua / Qui
Startup SCA - Toronto 3000 (P1 e P2)	High Link	0%	16/10/20	20/10/20	Sex / Ter
Startup SCA - Hong Kong 1000	High Link	0%	21/10/20	22/10/20	Qua / Qui
Startup SCA - Hong Kong 2000	High Link	0%	23/10/20	24/10/20	Sex / Sáb
Startup SCA - Hong Kong 3000	High Link	0%	26/10/20	27/10/20	Seg / Ter
Startup SCA - Londres DOCAS	High Link	0%	28/10/20	28/10/20	Qua / Qua
Startup SCA - Toronto DOCAS	High Link	0%	29/10/20	29/10/20	Qui / Qui
Startup SCA - Hong Kong DOCAS	High Link	0%	30/10/20	30/10/20	Sex / Sex
Entrega SCA	High Link	0%	**30/10/20**	**30/10/20**	Sex / Sex

6
